

Dokumentation




*Objekt Hammarbyhöjdens
tunnelbanestation
2010-06*



Specialist på fukt & mögelskador

GE AB

Garantientreprenad AB

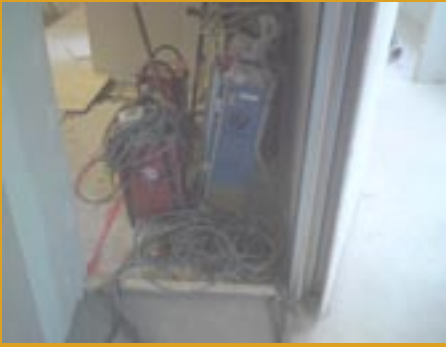

Delar av den projekterade ytan var inte tillgängliga för beläggning av Optivent systemet, dessa ytor lämnades orörda. Golvet har flytspacklats upp till jämn nivå.




För vidhäftning primades ytorna längs med ytterkanterna, både för tätning och kalaler.



Tröskeln mellan WC och hall sänkades och lagades i för att få en jämn övergång mellan rummen. Skarvar tätades för att minimera luftläckage.




Mellan betongen och Black Line fuktskyddsmatta, har Kombiduk stegljudsdämpare lagts ut.

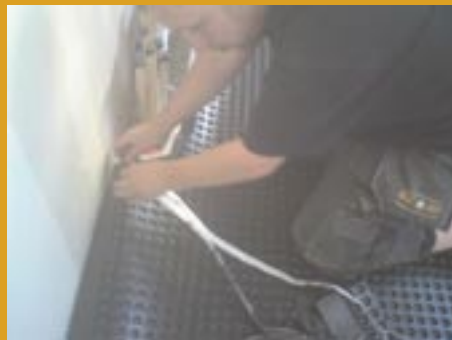

Längs med ytterkanterna tätades systemet med fogband och Stick & seal.



Stosen monterades efter placering på ritning.

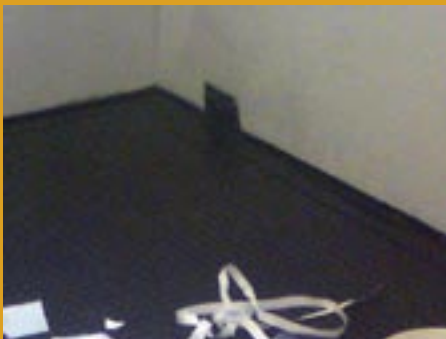

Nedsläppen monterades så stora som angavs på ritning.




Kanaler under Black Line har skapats för att få spridning enligt dimensionering, så att filterdonen inte blir placerade bakom ex. garderober utan ges fritt flöde av luft.



Filterhållare monterades och filter sattes i, Optivent systemet funktionstestades och är klart för golvläggning.

Det är mycket viktigt att filtren i filterdonen, dammsugs minst var fjortonde dag. Byte av filter bör ske med 12 - 24 månaders mellanrum.

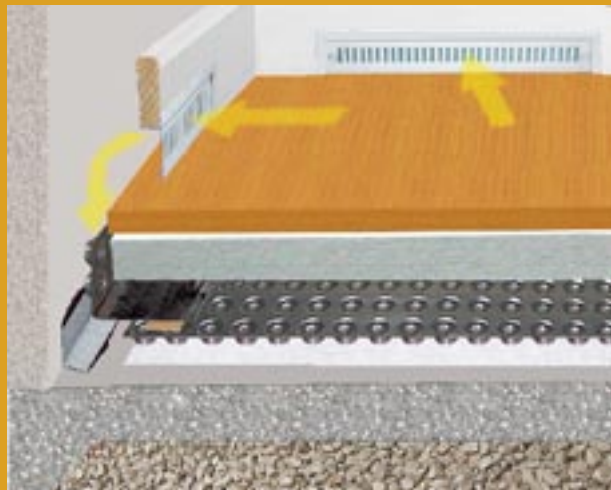

Optivent från Fuktspärsteknik AB ger ett avluftat golv som är luktfritt, fuktfritt samt behagligare värme på golvet, vilket ger en behagligare inomhusmiljö

När Du som kund använder en av Fuktspärsteknik certifierad entreprenör vet Du att Du får en utbildad person och trygghet i din fastighet. Våra certifierade entreprenörer jobbar enligt fastställd arbetsplan.

Bestämmande av uppdragets omfattning.

Bakgrund

I samband med renovering av lokaler önskades ett effektivt fuktskydd för att skydda övergolvet.

Yttrande

Invändigt.

Invändig okulär besiktning av lokalerna utfördes.

Golvet var nyligen flytspacklat och fuktpåverkan syntes utmed golv-ytterväggsvinkeln

Utförda arbeten.

De utförda arbetena är noggrant och fackmannamässigt enligt åtgärdsplan och alla moment är fotograferade samt att kunden har erhållit 9 st foton och ett intyg från entreprenören. System Optivent har installerats vid fuktutsatta ställen och filterhållare med filter är monterade. Kontroll av flöden är gjord vid luftintag samt täthet vid tätningar.

Anmärkning.

Delar av de projekterade ytorna var inte tillgängliga och kunde därmed inte beläggas enligt ritning.

Objektsansvarig:

Per-Ola Eriksson Garantientreprenad AB

Datum 20 - -



**OPTI
VENT**

Våra samarbetspartners är utbildade och jobbar enbart med typgodkända produkter/system från Fuktspärsteknik AB som har materialgaranti och är utprovade för att klara svåra förhållanden.

Se mer på www.fuktsparrteknik.se


Innan vi startar.



Vi besiktigar och fastställer uppdragets omfattning samt dokumenterar.



Vi rekommenderar rätt fuktskyddsmetod.




Vi arbetar endast med typgodkända material från Fuktspärreteknik AB.



Black Line

**OPTI
VENT**



Specialist på fukt & mögelskador

GE AB

Garantientrepenad AB



Vi fotar och dokumenterar vårt arbete som blir en värdehandling och trygghet för Dig.

Garantientrepenad AB
Industrivägen 1
515 92 Kinnarumma
