

Dokumentation



*Objekt hos privatperson
2010*






Innan installation av Opti Vent systemet utfördes, gjordes kontroll och genomgång för att fastställa rätt utförande, även syll mot baksidan mättes.



Bilden är tagen där garderob stod mot yttervägg i barnrum, innan arbetet sattes igång.



På alla golv och ytterväggar under mark, har beställaren i egen regi rengjort ytan för att uppnå bästa resultat.

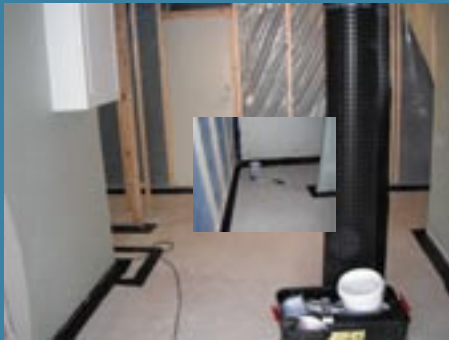

När allt bef golv tagits bort dammsögs ytan och 10 cm runt kanter på golv och väggar, primades för vidhäftning.



Fiberduk monterades för att undvika klapperljud.



Black Line är utlagd och luftnedsläpp monterade.



Golvbrunn är utbytt och ovan Opti Vent systemet spacklades ytan, fuktsäkrades och belades med klinker.




Regelstommar monterades ovan Opti Vent, skivor monterades i egen regi, så även övergolv ovan Opti Vent.



Utvändig fläkt är monterad för att minska ljudet i boytan, bilden visar sugpunkten.

Det är mycket viktigt att filtren i filterdonen, dammsugs minst var fjortonde dag. Byte av filter bör ske med 12 - 24 månaders mellanrum.

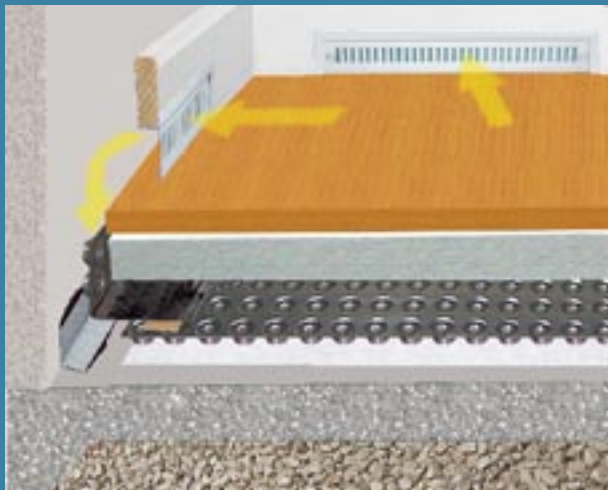

OptiVent från Fuktspärsteknik AB ger ett avluftat golv som är luktfritt, fuktfritt samt behagligare värme på golvet, vilket ger en behagligare inomhusmiljö

När Du som kund använder en av Fuktspärsteknik certifierad entreprenör vet Du att Du får en utbildad person och trygghet i din fastighet. Våra certifierade entreprenörer jobbar enligt fastställd arbetsplan.

Bestämmande av uppdragets omfattning.

Bakgrund

Fastighetsägaren har haft problem med microbiell lukt från golv och vägg i befintlig boyta.

Yttrande

Invändigt.

Invändig okulär besiktning av lokalerna utfördes.

Problem kontateras både gällande lukt och fukt i bottenplattan och vägg.

Utförda arbeten.

De utförda arbetena är noggrant och fackmannamässigt enligt åtgärdsplan och alla moment är fotograferade samt att kunden har erhållit minst 6 st foton och ett intyg från entreprenören. Hela golvytan har rensats på befintligt golv och ersatts med System Opti Vent samt att kunden i egen regi monterat nya övergolv. Filterdon med filter är monterade. Kontroll av flöden är gjorda vid luftintag samt täthet runt om, med godkänt resultat. Väggar är nya så att hela bottenvåningen har fått en ansiktslyftning. Utvändiga fläkt är monterad. Golv i tvätt har gjutits upp ovan Opti Vent och belagts med klinker som våtrumssäkring har helsvetsad våtrumsmatta använts (se separat intyg).

Anmärkning.

Alla golv och väggar är testade med mycket bra resultat gällande flöden.

Objektsansvarig:

Torbjörn Sääf Garantientreprenad AB

Datum 2010-07-01



**OPTI
VENT**

Våra samarbetspartners är utbildade och jobbar enbart med typgodkända produkter/system från Fuktspärsteknik AB som har materialgaranti och är utprovade för att klara svåra förhållanden.

Se mer detaljer på www.fuktsparren.se

Innan vi startar.



Vi besiktigar och fastställer uppdragets omfattning samt dokumenterar.



Vi rekommenderar rätt fuktskyddsmetod.



Vi arbetar endast med typgodkända material från Fuktspärreteknik AB.



Black Line

OPTI VENT



Vi fotar och dokumenterar vårt arbete som blir en värdehandling och trygghet för Dig.



Garantientreprenad AB
Industrivägen 1
515 92 Kinnarumma
